Auditoría del Tablero Project V2 — Intrale Platform

Fecha: 3 de marzo de 2026 | **Proyecto:** Intrale (org: intrale, Project #1) | **Generado por:** Scrum Master Agent (Claude)

1. Resumen Ejecutivo

182 Issues abiertos (repo)	**83** Items en Project V2	**115** Issues NO en el Project
132 Issues estancados (>14d)	**93** Sin labels	**141** Sin asignar
7 En Project sin status	**10** Columnas del board	

2. Columnas / Status del Project V2

El tablero cuenta con **10 columnas**:

#	Columna	Tipo	Items totales	Abiertos	Cerrados
1	**Backlog Tecnico**	Backlog	44	33	11
2	**Backlog CLIENTE**	Backlog	9	9	0
3	**Backlog NEGOCIO**	Backlog	13	10	3
4	**Backlog DELIVERY**	Backlog	9	8	1
5	**Todo**	Flujo	0	0	0
6	**Refined**	Flujo	0	0	0
7	**In Progress**	Flujo	0	0	0
8	**Ready**	Flujo	0	0	0
9	**Done**	Final	0	0	0
10	**Blocked**	Excepción	0	0	0

Distribución visual

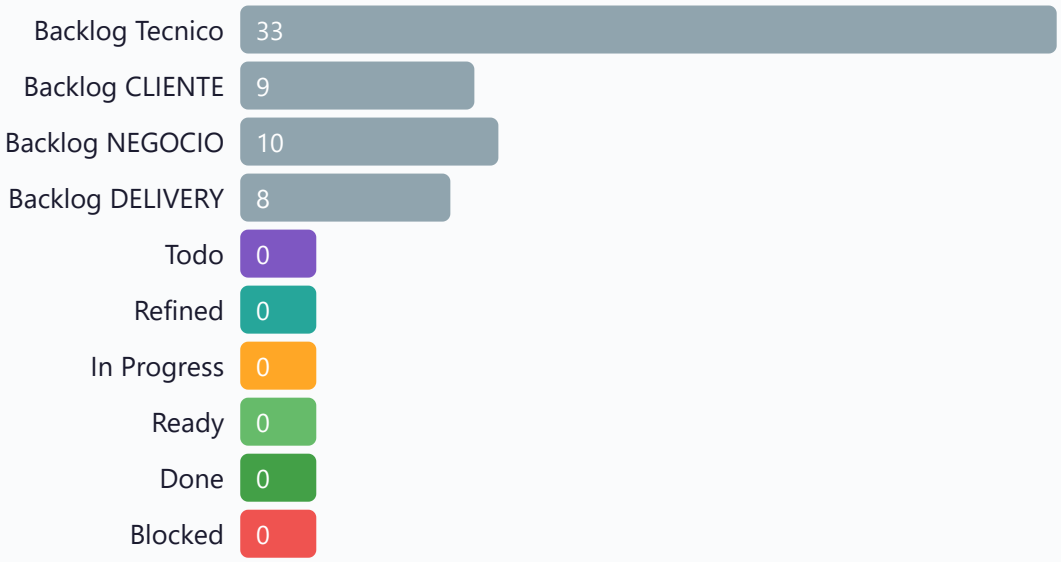

3. Análisis de Flujo

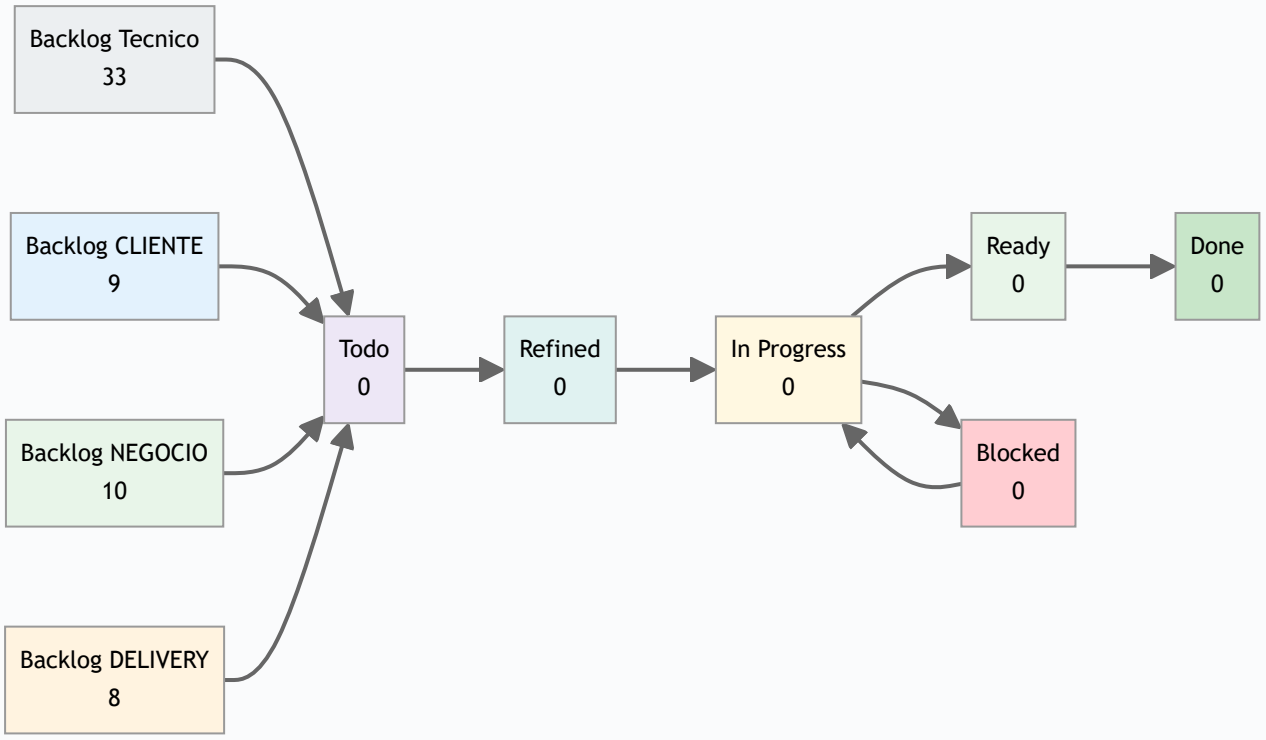

Observaciones del flujo

- **Backlogs acumulados:** 60 issues en los 4 backlogs (33 técnico, 9 cliente, 10 negocio, 8 delivery)
- **En flujo activo:** 0 Todo + 0 Refined + 0 In Progress + 0 Ready = **0** items
- **Done:** 0 items (0 cerrados, 0 aún abiertos)
- **Blocked:** 0 items
- **Issues cerrados NO en Done:** 16 items — posible desincronización de automatización

4. Issues sin Labels

Se encontraron **93** issues abiertos sin ningún label:

#	Título	Asignado	Última actividad
#498	Migrar ChangePasswordScreen a Txt + MessageKey	Sin asignar	30/10/2025 (123d)
#497	Migrar ButtonsPreviewScreen a Txt + MessageKey	Sin asignar	30/10/2025 (123d)
#474	Capa KMP de i18n unificada — L10n.t(S....) con catálogo y overrides por negocio/idioma	Sin asignar	21/10/2025 (132d)
#473	Bloquear en compilación los usos de APIs viejas de string resources con KSP (multiplataforma)	Sin asignar	21/10/2025 (132d)
#472	Issue: Erradicar definitivamente errores Base64 de compose-resources en Android (uso exclusivo de R.string + validación automática)	Sin asignar	17/10/2025 (136d)
#466	Política Codex: ramas siempre desde develop y PRs contra develop	leitocodexbot	17/10/2025 (136d)
#462	Actualizar navigation-compose a versión estable (evitar alpha bajo recomposición)	Sin asignar	12/10/2025 (141d)
#461	Mantener compatibilidad Android si se decide usar compose-resources (alinear generación y evitar colisiones)	Sin asignar	12/10/2025 (141d)
#460	Migrar strings en Android a androidx.compose.ui.res.stringResource (evitar compose-resources en Android)	Sin asignar	12/10/2025 (141d)
#458	Issue: Crash en stringResource por decodificación Base64 — Corrección y alineación de versiones Compose Resources	Sin asignar	12/10/2025 (141d)
#456	Issue: Error al decodificar recursos de texto (Base64.decode en org.jetbrains.compose.resources)	Sin asignar	12/10/2025 (141d)
#452	Guardado definitivo de la personalización y sincronización con la app	Sin asignar	12/10/2025 (141d)
#451	Vista previa en tiempo real de los cambios de personalización	Sin asignar	12/10/2025 (141d)
#450	Carga de imágenes, logotipo e ícono de app Android	Sin asignar	12/10/2025 (141d)

#448	Configuración de colores por componente	Sin asignar	14/11/2025 (108d)
#447	Acceso al panel de personalización	leitocodexbot	12/10/2025 (141d)
#433	Story: mejorar README general del proyecto	Sin asignar	8/10/2025 (145d)
#416	Resetear main al estado de PRE_UPDATE_BUILD_BY_BRAND (limpieza de baseline)	Sin asignar	8/10/2025 (145d)
#413	[codex] init.sh: no instalar Android por defecto y tolerar SIGPIPE (fix exit 141)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#403	H2.5.S5 — Observabilidad (publish)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#402	H2.5.S4 — Tests e2e: publish / conflict / rollback	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#401	H2.5.S3 — Invalidación de cache del publicado	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#400	H2.5.S2 — Handler: POST publish (+ idempotencia opcional)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#399	H2.5.S1 — Repositorio: setPublished(businessId, newVersion, expectedPrevVersion)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#398	H2.5.S0 — OpenAPI: POST /branding/{businessId}/publish (+ rollback)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#397	H2.4.S4 — Observabilidad (preview)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#396	H2.4.S3 — Tests e2e (preview OK / not found)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#395	H2.4.S2 — Handler: GET preview	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#394	H2.4.S1 — Repositorio: getTheme(businessId, version)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#393	H2.4.S0 — OpenAPI: GET /branding/{businessId}/preview?version=N	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#392	H2.3.S6 — Observabilidad (published)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)

#391	H2.3.S5 — Tests e2e (published / not found / 304)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#390	H2.3.S4 — Cache en memoria (TTL corto)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#389	H2.3.S3 — ETag / If-None-Match (opcional)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#388	H2.3.S2 — Handler: GET publicado	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#387	H2.3.S1 — Repositorio: getPublished(...)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#386	H2.3.S0 — OpenAPI: GET /branding/{businessId} (published)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#385	H2.2.S7 — Observabilidad: logs y métricas del draft	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#384	H2.2.S6 — Tests e2e con DynamoDB Local	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#383	H2.2.S5 — (Opcional) Validación de assets referenciados	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#382	H2.2.S4 — Handler: POST /draft	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#381	H2.2.S3 — Repositorio: putDraftNextVersion(...)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#380	H2.2.S2 — Validación: JSON Schema mínimo del payload	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#379	H2.2.S1 — Integración con auth existente (sólo contexto)	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#378	H2.2.S0 — OpenAPI: POST /branding/{businessId}/draft	Sin asignar	2/10/2025 (151d)
#377	H2.1.S6 — DynamoDB Local (docker) + tests del repositorio	Sin asignar	3/10/2025 (150d)
#376	H2.1.S5 — Seed Dev: guía manual (Console) + script local (CLI)	Sin asignar	3/10/2025 (150d)
#375	H2.1.S2 — (Opcional) Runbook: Crear GSI de Drafts (si volumen lo requiere)	Sin asignar	3/10/2025 (150d)

#374	H2.1.S1b — Documentación: Naming + IAM mínima para el servicio	Sin asignar	3/10/2025 (150d)
#373	H2.1.S1 — Runbook: Crear la tabla manualmente en AWS Console	Sin asignar	3/10/2025 (150d)
#372	H2.1.S0 — ADR: Modelo single-table DynamoDB (claves y accesos)	Sin asignar	3/10/2025 (150d)
#348	Validar cantidad de request que se atienden por segundo	Sin asignar	28/9/2025 (155d)
#347	H2.1.S6 — Pruebas locales con DynamoDB Local (docker-compose)	Sin asignar	28/9/2025 (155d)
#346	H2.1.S5 — Script de seed (dev): negocio + tema publicado v1	Sin asignar	28/9/2025 (155d)
#345	H2.1.S4 — Publicación: condición de unicidad (marker con ConditionExpression)	Sin asignar	28/9/2025 (155d)
#344	H2.1.S3 — Repositorio: contratos y mapeos (sin endpoints)	Sin asignar	28/9/2025 (155d)
#343	H2.1.S1 — Infra: Crear tabla DynamoDB branding (IaC mínima)	Sin asignar	28/9/2025 (155d)
#334	H1.3.S7 — README CI: cómo agregar una nueva marca	Sin asignar	26/9/2025 (157d)
#333	H1.3.S6 — Smoke tests pos-build (label/ids)	Sin asignar	26/9/2025 (157d)
#332	H1.3.S5 — Naming de artifacts + checksum	Sin asignar	26/9/2025 (157d)
#331	H1.3.S4 — Cache de Gradle y Pods/SPM (opcional, performance)	Sin asignar	26/9/2025 (157d)
#330	H1.3.S3 — Gestión de secretos por brand (firma y endpoints protegidos)	Sin asignar	26/9/2025 (157d)
#329	H1.3.S2 — Job iOS: build por brand y publicación de artifacts	Sin asignar	26/9/2025 (157d)
#328	H1.3.S1 — Job Android: build por brand y publicación de artifacts	Sin asignar	26/9/2025 (157d)
#327	H1.3.S0 — Matriz de marcas y parámetros estándar (Workflows)	Sin asignar	1/10/2025 (152d)

#285	valide la documentacion y que cree un issue nuevo donde mencione todos los puntos a mejorar o actualizar de toda la documentacion del proyecto	Sin asignar	21/9/2025 (162d)
#283	P0 – Bloqueo de navegación por fallos al resolver textos de recursos (Base64/pack de strings). Inaceptable que el Dashboard quede inaccesible tras cambios	Sin asignar	21/9/2025 (162d)
#275	Build roto tras el refactor del menú semicircular — Parche definitivo (Compose MPP) Tipo: fix / build + ui	Sin asignar	20/9/2025 (163d)
#253	Crear pack de íconos móviles y web con el icono #1 (A-triángulo)	Sin asignar	18/9/2025 (165d)
#232	Documentación y Storybook interno (opcional)	Sin asignar	17/9/2025 (166d)
#230	Ampliación pack de íconos (16–24)	Sin asignar	17/9/2025 (166d)
#229	Accesibilidad y rendimiento de animaciones	Sin asignar	17/9/2025 (166d)
#228	Theming & Tipografía (consistencia)	Sin asignar	17/9/2025 (166d)
#227	Unificación flujo Registro	Sin asignar	16/9/2025 (167d)
#225	Aplicar nuevo botón + íconos en Home	Sin asignar	16/9/2025 (167d)
#155	Agregar botones para acceder a Recuperación y confirmación de contraseña en la pantalla de login	leitocodexbot	31/7/2025 (214d)
#146	Hacer el componente TextField compatible con ExposedDropdownMenuBox	Sin asignar	30/7/2025 (215d)
#72	Issue al inicializar el front	leitocodexbot	8/7/2025 (237d)
#67	[Pantalla] Visualización de perfiles disponibles	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#66	[Pantalla] Configuración de autoaceptación de deliveries	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#64	[Pantalla] Asignación de perfiles a usuarios	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#58	[Pantalla] Visualización de perfiles disponibles	Sin asignar	6/7/2025 (239d)

#57	[Pantalla] Configuración de autoaceptación de deliveries	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#56	[Pantalla] Unión de deliveries a negocio	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#55	[Pantalla] Asignación de perfiles a usuarios	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#54	[Pantalla] Registro y aprobación de negocios	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#53	[Pantalla] Cambio de contraseña	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#52	[Pantalla] Autenticación en dos pasos	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#51	[Pantalla] Recuperación y confirmación de contraseña	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#50	[Pantalla] Registro de usuario por perfil	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#49	[auto] Faltan pantallas para cubrir servicios	Sin asignar	6/7/2025 (239d)
#21	Agregar pruebas de integración para Profiles	Sin asignar	3/7/2025 (242d)
#13	[auto] Enumerar funciones sin pruebas de integración	Sin asignar	2/7/2025 (243d)

5. Issues sin Asignar

Se encontraron **141** issues abiertos sin asignar (77% del total).

Se muestran los 20 más recientes. Ver listado completo en el Project V2.

#	Título	Labels	Última actividad
#1127	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Personalización del negocio	Backlog area:configuracion area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1126	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Solicitar y revisar unión a negocio	Backlog area:onboarding area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1125	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Perfil y disponibilidad del repartidor	Backlog area:configuracion area:perfil app:delivery area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1124	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Detalle de pedido y flujo de estados (delivery)	Backlog area:delivery app:delivery area:estado area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1123	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Home y dashboard del repartidor	Backlog area:delivery app:delivery area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1122	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Perfil y direcciones del cliente	Backlog app:client area:perfil area:direcciones area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1121	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Carrito de compras y pedidos (cliente)	Backlog area:pedidos app:client area:carrito area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1120	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Catálogo y detalle de producto (cliente)	Backlog area:productos app:client area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1119	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Entry y onboarding del cliente	Backlog area:onboarding app:client area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1118	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Gestión de categorías (CRUD)	Backlog area:productos area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)
#1116	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Dashboard de negocio	Backlog area:dashboard area:testing qa-compliance	1/3/2026 (1d)

#742	DSEC-001 – Integración básica con autenticación en dos pasos (2FA) para delivery	from-intake app:delivery	18/12/2025 (74d)
#741	DCMM-001 – Contacto con comercio o cliente desde la app delivery	from-intake area:pedidos app:delivery area:comunicacion	18/12/2025 (74d)
#740	DNOT-001 – Notificaciones de nuevos pedidos y cambios de estado	from-intake area:notificaciones app:delivery	18/12/2025 (74d)
#737	DHIST-001 – Historial de pedidos del repartidor	from-intake area:pedidos app:delivery area:historial	18/12/2025 (74d)
#736	DORD-004 – Confirmación de entrega y resultado del pedido	from-intake area:pedidos app:delivery area:estado	18/12/2025 (74d)
#735	DLOC-001 – Placeholder de ubicación y mapa en app de repartidores	from-intake app:delivery area:ubicacion	18/12/2025 (74d)
#734	DSTA-001 – Flujo básico de estados de entrega	from-intake area:pedidos app:delivery area:estado	18/12/2025 (74d)
#732	DORD-002 – Listado de pedidos disponibles para tomar	from-intake area:pedidos app:delivery area:asignacion	18/12/2025 (74d)
#727	[INTAKE] Backlog DELIVERY – features app de repartidores	intake-processed	18/12/2025 (74d)

6. Issues en Project V2 sin Status Definido

Se encontraron **7** items abiertos en el Project sin status:

#	Título	Labels
#1143	[UX] Agregar feedback visual durante auto-login con sesión previa	enhancement ux
#1144	[UX] Mejorar flujo Password Recovery: email pre-cargado, teclado numérico, reenviar código	enhancement ux
#1145	[UX] Separar cambio de contraseña temporal en pantalla dedicada	enhancement ux
#1146	[UX] Agregar validación inline en PasswordRecoveryScreen	bug ux
#1147	[UX] Reorganizar jerarquía de links secundarios en pantalla de Login	enhancement ux
#1148	[UX] Agregar indicador de fortaleza y coincidencia de contraseñas	enhancement ux
#1159	feat(hooks): Aprendizaje adaptativo de permisos — permission-memory.js	enhancement tipo:infra area:infra area:seguridad

7. Issues Abiertos NO incluidos en el Project V2

Se encontraron **115** issues abiertos que NO están en el tablero Project V2.

#	Título	Labels	Asignado	Creado
#1173	guard: bloquear ediciones de código fuera de un worktree dedicado	enhancement tipo:infra area:infra	leitolarreta	3/3/2026
#1139	feat: Sistema de reintentos con escalada de urgencia para permisos de Telegram	enhancement	leitolarreta	1/3/2026
#1138	feat: Sistema de reintentos con escalada de urgencia para permisos de Telegram	enhancement	leitolarreta	1/3/2026
#727	[INTAKE] Backlog DELIVERY – features app de repartidores	intake-processed	Sin asignar	18/12/2025
#681	[INTAKE] Backlog CLIENTE – features app cliente (usuarios compradores)	app:business	Sin asignar	17/12/2025
#615	[INTAKE] Backlog NEGOCIO – features app de negocios (admin de comercios)	intake-processed	Sin asignar	17/12/2025
#613	BPROD-003 – Publicación de productos hacia la app cliente	stream:NEGOCIO app:business tipo:infra from-intake area:productos	Sin asignar	17/12/2025
#612	BPROD-002 – Alta y edición de producto	stream:NEGOCIO app:business from-intake area:productos	Sin asignar	17/12/2025
#610	BAPP-003 – Dashboard de administración de negocio	stream:NEGOCIO app:business from-intake area:dashboard	Sin asignar	17/12/2025
#607	[INTAKE] Backlog NEGOCIO – primera carga de historias	intake-processed	Sin asignar	16/12/2025
#603	Home / dashboard de la app de negocio	enhancement stream:NEGOCIO	Sin asignar	26/11/2025

		area:dashboard		
#602	Onboarding y login de la app de negocio	enhancement stream:NEGOCIO area:onboarding	Sin asignar	26/11/2025
#601	App de negocio como variante de build (APP_TYPE=BUSINESS)	enhancement stream:NEGOCIO app:business	Sin asignar	26/11/2025
#599	Ajustar espacio superior en pantallas de cliente	enhancement	Sin asignar	24/11/2025
#597	Pantalla de carrito y resumen de pedido	enhancement area:pedidos	Sin asignar	24/11/2025
#498	Migrar ChangePasswordScreen a Txt + MessageKey		Sin asignar	30/10/2025
#497	Migrar ButtonsPreviewScreen a Txt + MessageKey		Sin asignar	30/10/2025
#483	Migrar resto de pantallas a nueva API de strings y eliminar dependencias legacy	strings refactor	Sin asignar	28/10/2025
#474	Capa KMP de i18n unificada — L10n.t(S....) con catálogo y overrides por negocio/idioma		Sin asignar	21/10/2025
#473	Bloquear en compilación los usos de APIs viejas de string resources con KSP (multiplataforma)		Sin asignar	21/10/2025
#472	Issue: Erradicar definitivamente errores Base64 de compose-resources en Android (uso exclusivo de R.string + validación automática)		Sin asignar	17/10/2025
#466	Política Codex: ramas siempre desde develop y PRs contra develop		leitocodexbot	17/10/2025
#462	Actualizar navigation-compose a versión estable (evitar alpha bajo recomposición)		Sin asignar	12/10/2025
#461	Mantener compatibilidad Android si se decide usar compose-resources (alinear generación y evitar colisiones)		Sin asignar	12/10/2025
#460	Migrar strings en Android a androidx.compose.ui.res.stringResource (evitar compose-resources en Android)		Sin asignar	12/10/2025

#458	Issue: Crash en stringResource por decodificación Base64 — Corrección y alineación de versiones Compose Resources		Sin asignar	12/10/2025
#456	Issue: Error al decodificar recursos de texto (Base64.decode en org.jetbrains.compose.resources)		Sin asignar	12/10/2025
#452	Guardado definitivo de la personalización y sincronización con la app		Sin asignar	12/10/2025
#451	Vista previa en tiempo real de los cambios de personalización		Sin asignar	12/10/2025
#450	Carga de imágenes, logotipo e ícono de app Android		Sin asignar	12/10/2025

... y 85 más.

8. Issues Estancados (>14 días sin actividad)

Se encontraron **132** issues sin actividad en más de 14 días (73% del total).

Distribución por antigüedad



Top 15 issues más estancados

#	Título	Labels	Última actividad	Días
#13	[auto] Enumerar funciones sin pruebas de integración		2/7/2025	**243**
#27	Agregar pruebas de integración para TestDynamoDB	blocked	3/7/2025	**242**
#21	Agregar pruebas de integración para Profiles		3/7/2025	**242**
#49	[auto] Faltan pantallas para cubrir servicios		6/7/2025	**239**
#50	[Pantalla] Registro de usuario por perfil		6/7/2025	**239**
#51	[Pantalla] Recuperación y confirmación de contraseña		6/7/2025	**239**
#53	[Pantalla] Cambio de contraseña		6/7/2025	**239**
#52	[Pantalla] Autenticación en dos pasos		6/7/2025	**239**
#54	[Pantalla] Registro y aprobación de negocios		6/7/2025	**239**
#55	[Pantalla] Asignación de perfiles a usuarios		6/7/2025	**239**
#57	[Pantalla] Configuración de autoaceptación de deliveries		6/7/2025	**239**
#56	[Pantalla] Unión de deliveries a negocio		6/7/2025	**239**
#58	[Pantalla] Visualización de perfiles disponibles		6/7/2025	**239**
#64	[Pantalla] Asignación de perfiles a usuarios		6/7/2025	**239**
#66	[Pantalla] Configuración de autoaceptación de deliveries		6/7/2025	**239**

9. Verificación de Backlogs

9.1 Backlog CLIENTE (9 items abiertos)

#	Título	Labels	Creado
#716	CPROD-001 – Detalle de producto en la app cliente	from-intake area:productos app:client backlog-tecnico	18/12/2025
#717	CCART-001 – Visualización del carrito de compras	from-intake app:client area:carrito	18/12/2025
#718	CCART-002 – Confirmación de pedido y resumen de compra	from-intake app:client area:carrito area:checkout	18/12/2025
#720	CPAY-001 – Selección de medio de pago en app cliente	from-intake area:pagos app:client area:checkout	18/12/2025
#721	CORD-001 – Listado de pedidos del cliente	from-intake area:pedidos app:client	18/12/2025
#722	CORD-002 – Detalle y seguimiento básico de pedido	from-intake area:pedidos app:client	18/12/2025
#723	CORD-003 – Repetir un pedido anterior	from-intake area:pedidos app:client area:carrito	18/12/2025
#724	CNOT-001 – Notificaciones de pedidos y mensajes del negocio	from-intake app:client area:notificaciones	18/12/2025
#726	CSEC-001 – Integración básica con autenticación en dos pasos (2FA) para cliente	from-intake app:client area:seguridad	18/12/2025

9.2 Backlog NEGOCIO (10 items abiertos)

#	Título	Labels	Creado
#672	BPROD-005 – Configuración de productos destacados y promociones	app:business from-intake area:productos area:marketing	17/12/2025
#673	BORD-001 – Listado de pedidos del negocio con filtros básicos	app:business from-intake area:pedidos	17/12/2025

#674	BORD-002 – Detalle de pedido y actualización de estado	app:business from-intake area:pedidos	17/12/2025
#675	BDEL-001 – Gestión de repartidores del negocio	app:business from-intake area:delivery	17/12/2025
#676	BDEL-002 – Asignación de pedidos a repartidores	app:business from-intake area:pedidos area:delivery	17/12/2025
#677	BCONF-001 – Configuración de datos básicos del negocio	app:business from-intake area:configuracion	17/12/2025
#678	BCONF-002 – Configuración de horarios de atención y zonas de entrega	app:business from-intake area:configuracion	17/12/2025
#679	BCONF-003 – Configuración de medios de pago aceptados	app:business from-intake area:configuracion area:pagos	17/12/2025
#680	BCONF-004 – Gestión de banners y mensajes de marketing del negocio	app:business from-intake area:marketing area:configuracion	17/12/2025
#1174	Scrum Master: auditoría del tablero de historias y propuesta de mejoras (Project V2)	enhancement tipo:infra area:infra	3/3/2026

9.3 Backlog DELIVERY (8 items abiertos)

#	Título	Labels	Creado
#732	DORD-002 – Listado de pedidos disponibles para tomar	from-intake area:pedidos app:delivery area:asignacion	18/12/2025
#734	DSTA-001 – Flujo básico de estados de entrega	from-intake area:pedidos app:delivery area:estado	18/12/2025
#735	DLOC-001 – Placeholder de ubicación y mapa en app de repartidores	from-intake app:delivery area:ubicacion	18/12/2025
#736	DORD-004 – Confirmación de entrega y resultado del pedido	from-intake area:pedidos app:delivery area:estado	18/12/2025
#737	DHIST-001 – Historial de pedidos del repartidor	from-intake area:pedidos app:delivery area:historial	18/12/2025
#740	DNOT-001 – Notificaciones de nuevos pedidos y cambios de estado	from-intake area:notificaciones app:delivery	18/12/2025

#741	DCMM-001 – Contacto con comercio o cliente desde la app delivery	from-intake area:pedidos app:delivery area:comunicacion	18/12/2025
#742	DSEC-001 – Integración básica con autenticación en dos pasos (2FA) para delivery	from-intake app:delivery	18/12/2025

9.4 Backlog Técnico (33 items abiertos)

33 items. Los más recientes:

#	Título	Labels	Creado
#1171	bug: botones de aprobación de permisos en Telegram no responden nuevamente	bug tipo:infra area:infra	3/3/2026
#1170	hooks: validar que toda implementación de historia corra en un worktree aislado	enhancement tipo:infra area:infra	3/3/2026
#1169	hooks: actualizar mensaje Telegram cuando permiso se resuelve desde la terminal	enhancement tipo:infra area:infra	3/3/2026
#1127	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Personalización del negocio	Backlog area:configuracion area:testing qa-compliance	1/3/2026
#1126	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Solicitar y revisar unión a negocio	Backlog area:onboarding area:testing qa-compliance	1/3/2026
#1125	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Perfil y disponibilidad del repartidor	Backlog area:configuracion area:perfil app:delivery area:testing qa-compliance	1/3/2026
#1124	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Detalle de pedido y flujo de estados (delivery)	Backlog area:delivery app:delivery area:estado area:testing qa-compliance	1/3/2026
#1123	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Home y dashboard del repartidor	Backlog area:delivery app:delivery area:testing qa-compliance	1/3/2026
#1122	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Perfil y direcciones del cliente	Backlog app:client area:perfil area:direcciones area:testing qa-compliance	1/3/2026
#1121	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Carrito de compras y pedidos (cliente)	Backlog area:pedidos app:client area:carrito area:testing qa-compliance	1/3/2026

10. Análisis de Labels

10.1 Labels más usados (top 20)

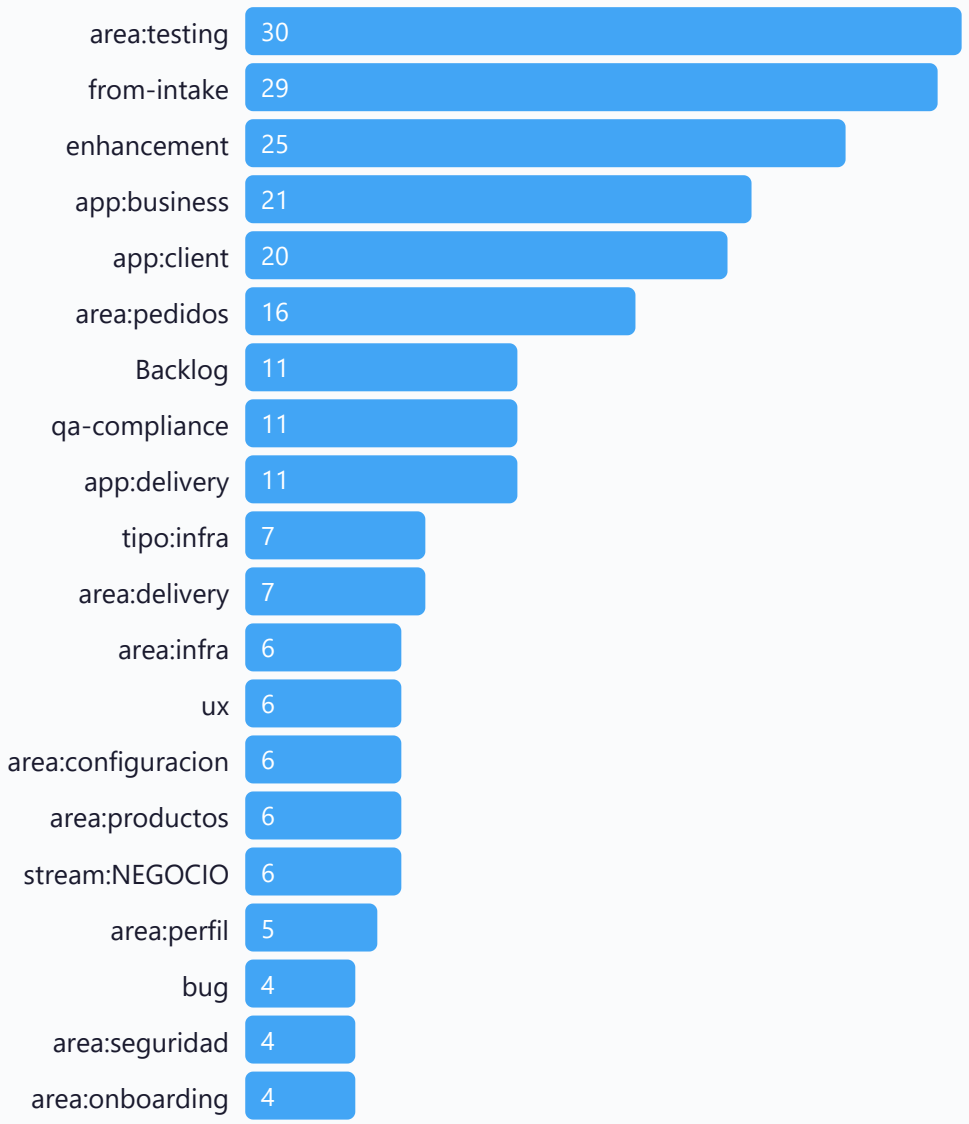

10.2 Labels de área (area:*)

Label	Cantidad
area:testing	30
area:pedidos	16
area:delivery	7
area:infra	6
area:configuracion	6

area:productos	6
area:perfil	5
area:seguridad	4
area:onboarding	4
area:carrito	4
area:estado	3
area:direcciones	3
area:dashboard	3
area:notificaciones	2
area:pagos	2
area:checkout	2
area:marketing	2
area:comunicacion	1
area:historial	1
area:ubicacion	1
area:asignacion	1

10.3 Labels de app (app:*)

Label	Cantidad
app:business	21
app:client	20
app:delivery	11

10.4 Labels de tipo (tipo:*)

Label	Cantidad
tipo:infra	7

11. Cuellos de Botella Detectados

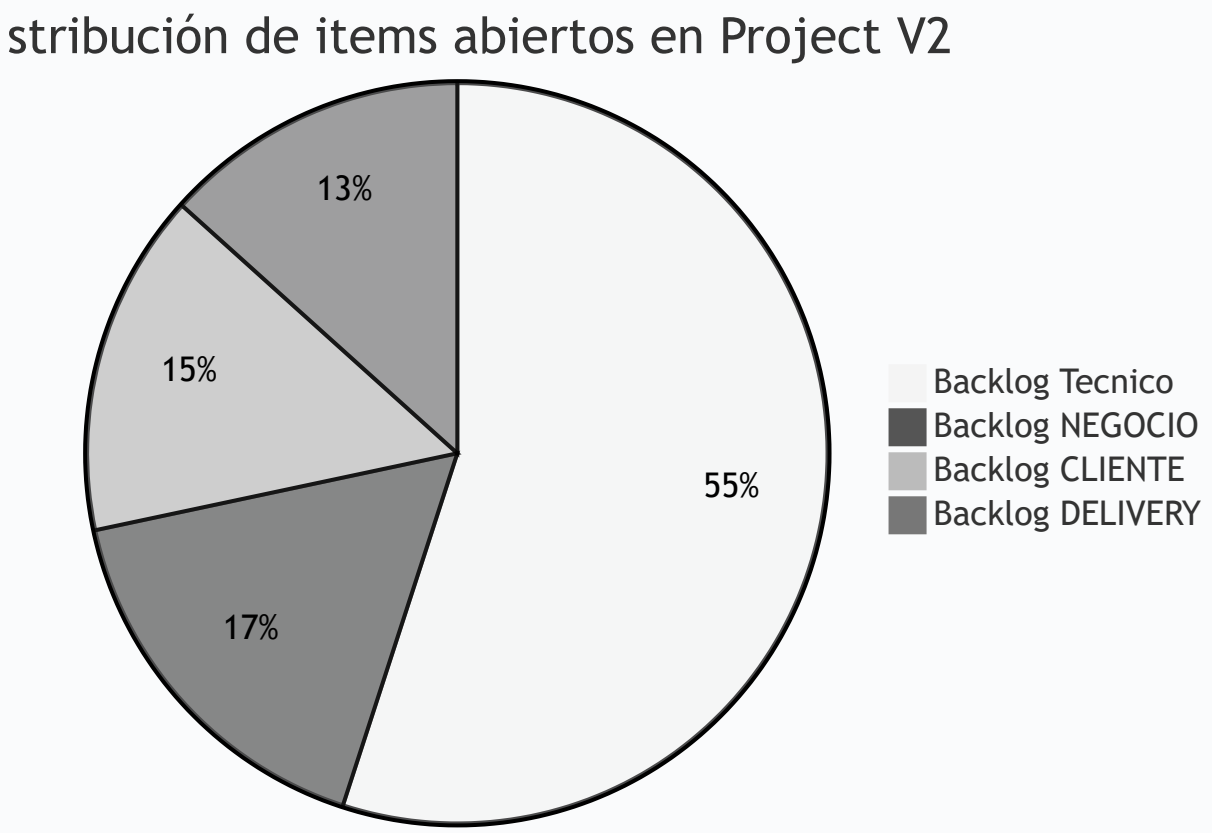

- **Backlogs sobrecargados:** 60 items acumulados en backlogs. Riesgo de perder visibilidad sobre prioridades.
- **Cuello en refinamiento:** No hay items en Todo ni Refined. Los backlogs no están fluyendo hacia el ciclo de desarrollo.
- **Issues fuera del tablero:** 115 issues abiertos no están en el Project V2. Se pierde trazabilidad.
- **Alta proporción de issues estancados:** 73% de issues sin actividad en >14d.
- **Muchos issues sin asignar:** 141 de 182 (77%). Dificulta la rendición de cuentas.
- **Desincronización:** 16 issues cerrados no están en la columna Done.

12. Propuestas de Mejora Priorizadas

PRIORIDAD ALTA

P1 — INCORPORAR TODOS LOS ISSUES ABIERTOS AL PROJECT V2

Problema: 115 issues abiertos no están en el tablero, lo que impide visualizar el alcance real del trabajo pendiente.

Acción: Ejecutar un triaje masivo con `/priorizar` para agregar los issues faltantes al Project V2 con el status correcto. Automatizar con GitHub Action que añada issues nuevos al Project automáticamente.

Impacto: Visibilidad completa del backlog y mejor planificación de sprints.

P2 — ETIQUETAR ISSUES SIN LABELS

Problema: 93 issues sin labels dificultan el filtrado y la priorización.

Acción: Aplicar labels de `area:*`, `app:*` y `tipo:*` a todos los issues sin etiquetar. Usar `/priorizar` para el triaje masivo.

Impacto: Mejor categorización y capacidad de filtro en el board.

P3 — MOVER ISSUES DEL BACKLOG AL FLUJO ACTIVO

Problema: 60 items acumulados en backlogs con 0 items en Todo/Refined. Los backlogs no están fluyendo al ciclo de desarrollo.

Acción: En cada sprint planning, mover los items priorizados de los backlogs a "Todo". Refinar con `/po` y mover a "Refined" antes de iniciar desarrollo.

Impacto: Activar el flujo de desarrollo con prioridades claras.

PRIORIDAD MEDIA

P4 — IMPLEMENTAR WIP LIMITS

Problema: Sin límite de WIP, existe riesgo de context-switching excesivo cuando hay muchos items en "In Progress".

Acción: Establecer WIP limit de 3 para "In Progress" y 5 para "Ready". Implementar validación via GitHub Action o hook en el proceso de triaje.

Impacto: Mayor foco y throughput del equipo.

P5 — AUTOMATIZAR MOVIMIENTO DE ISSUES A DONE

Problema: 16 issues cerrados no están en Done, y 0 issues en Done siguen abiertos.

Acción: El hook `post-issue-close.js` ya existe pero no cubre todos los casos. Agregar GitHub Action que sincronice: issue cerrado → columna Done, y que cierre issues en Done que sigan abiertos.

Impacto: Board siempre sincronizado con el estado real.

P6 — REVISAR Y ARCHIVAR ISSUES ESTANCADOS

Problema: 132 issues sin actividad en más de 14 días (73% del total). Muchos son historias de backlog de funcionalidad (from-intake) que no se han refinado.

Acción: Clasificar los issues estancados en 3 categorías: (a) cerrar si son obsoletos, (b) mantener en backlog si son válidos pero no prioritarios, (c) refinar y mover a Todo si son necesarios a corto plazo.

Impacto: Backlog más limpio y menor ruido en la planificación.

P7 — AGREGAR COLUMNA "IN REVIEW"

Problema: El flujo actual salta de "In Progress" a "Ready" sin distinguir el estado de code review/QA.

Acción: Agregar columna "In Review" entre "In Progress" y "Ready". El agente `/delivery` puede mover automáticamente al crear PR. Cuando el PR se mergea → "Ready".

Impacto: Mayor visibilidad del proceso de revisión y QA.

PRIORIDAD BAJA

P8 — ESTANDARIZAR USO DE LABELS TIPO:*

Problema: Solo 1 labels de tipo en uso. Muchos issues usan "enhancement" genérico sin tipo: más específico.

Acción: Definir labels de tipo estándar: `tipo:feature`, `tipo:bug`, `tipo:qa`, `tipo:docs`, `tipo:refactor` y aplicarlos consistentemente.

Impacto: Mejor clasificación para métricas de calidad y velocidad.

P9 — IMPLEMENTAR GITHUB ACTION PARA AUTO-AGREGAR ISSUES AL PROJECT

Problema: Los issues nuevos no se agregan automáticamente al Project V2.

Acción: Crear workflow `.github/workflows/add-to-project.yml` que añada todo issue nuevo al Project con status según sus labels (ej: `from-intake` → backlog correspondiente).

Impacto: Elimina la tarea manual de agregar issues al board.

P10 — ASIGNAR ISSUES DE BACKLOG FUNCIONAL

Problema: 141 issues sin asignar, la mayoría son historias de backlog funcional importadas desde intake.

Acción: Asignar un product owner responsable de cada backlog (CLIENTE, NEGOCIO, DELIVERY) y marcar los issues con el responsable.

Impacto: Ownership claro de cada área funcional.

13. Métricas del Board

Métrica	Valor	Estado
Issues abiertos totales	182	—
Items en Project V2	83	—
Cobertura del Project	37%	BAJA
Issues con labels	89 / 182 (49%)	MEJORAR
Issues asignados	41 / 182 (23%)	MEJORAR
Issues estancados (>14d)	132 (73%)	CRITICO
WIP (In Progress)	0	OK
Blocked	0	OK
Labels de área únicos	21	—
Labels de app únicos	3	—

14. Conclusión

El tablero Project V2 de Intrale tiene una estructura de columnas sólida con 10 status que cubren el flujo completo desde backlog hasta entrega. Sin embargo, se identifican **3 áreas críticas de mejora**:

1. **Cobertura del Project:** Solo el 37% de los issues abiertos están en el tablero. Los 115 issues faltantes necesitan ser triageados e incorporados.
2. **Flujo estancado:** Los backlogs acumulan 60 items pero las columnas de flujo activo (Todo, Refined) están vacías. Se necesita un proceso de refinamiento periódico.
3. **Issues estancados:** El 73% de issues no tiene actividad en >14 días. Se recomienda una revisión masiva para cerrar obsoletos y priorizar los relevantes.

Próximos pasos recomendados:

1. Ejecutar `/priorizar` para triaje masivo de issues sin labels y fuera del Project
2. Sprint planning: mover items priorizados de backlogs a "Todo"
3. Agregar columna "In Review" al board
4. Implementar GitHub Action para auto-agregar issues nuevos al Project
5. Establecer WIP limits y ciclo de revisión quincenal de issues estancados

---

Generado automáticamente por Scrum Master Agent — 2026-03-03T09:35:44.301Z — Intrale Platform v2.0
